


Erneuerung der Kanalisation in der Eickener Straße, Schulstraße, Heerstraße, Am Zoppenberg und Sechs Linden in Waldniel

Notwendigkeit der Baumaßnahme

- Kanal ist unterdimensioniert
- Herstellen von Stauraumvolumen für Starkregenereignisse
- Sanierung von Schäden im Kanal und an den Schächten
- Optimierung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanals

Ausbaubereich / Bauabschnitte

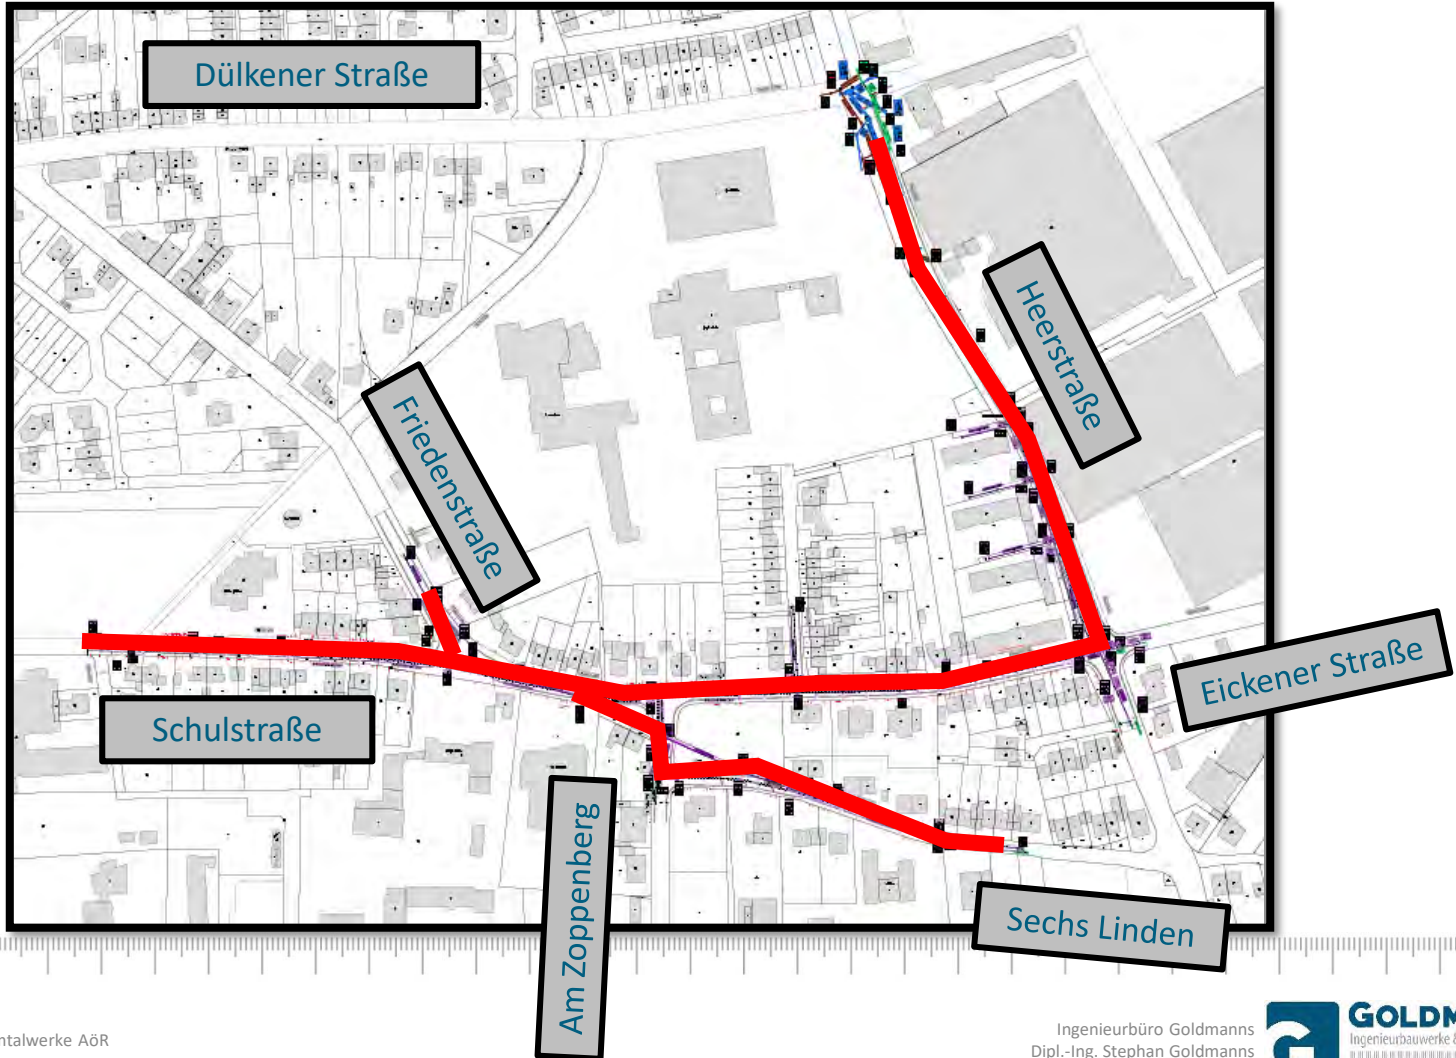

Ausbaubereich / Bauabschnitte

- Auszuführende Arbeiten:
 - Ca. 730 m Ei-Profil DN 700/1050
 - Ca. 240 m PP-Rohre DN 200 bis DN 315
 - Ca. 27 Betonschächte
 - Ca. 7.800 m³ Bodenaushub, bis zu einer Tiefe von ca. 4,00 m
 - Ca. 78 Hausanschlussleitungen
- Bausumme ca. 2.260.000 €


Ausbaubereich / Bauabschnitte

1. Bauabschnitt

Schulstraße 28c bis Ecke Friedenstraße
Bauzeit: KW 32 bis KW 44 / KW 47

2. Bauabschnitt

Friedenstraße bis Haus 31
Bauzeit: KW 45 bis KW 47

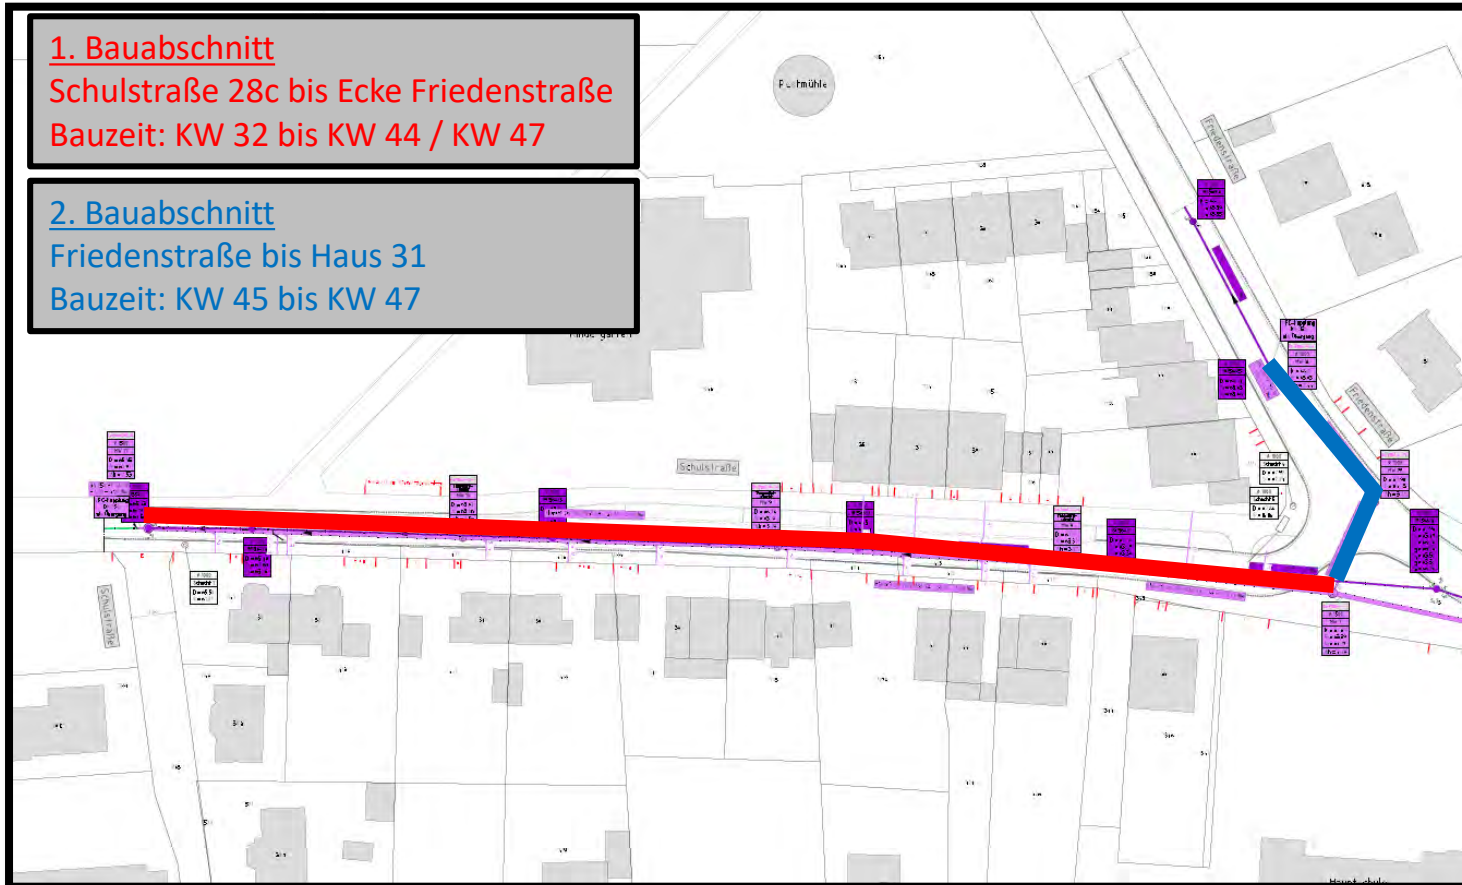

Ausbaubereich / Bauabschnitte

3. Bauabschnitt
Sanierung Trinkwasserleitung
in der Heerstraße
Bauzeit: KW 48 bis KW 03



Ausbaubereich / Bauabschnitte

4. Bauabschnitt

Friedenstraße bis Am Zoppenberg
Bauzeit : KW 4 bis KW 11 / KW 28

5. Bauabschnitt

Am Zoppenberg bis Heerstraße
Bauzeit: KW 12 bis KW 26 / KW 30

6. Bauabschnitt


Am Zoppenberg bis Sechs Linden
Bauzeit: KW 27 bis KW 30 (Herbstferien 2021)

7. Bauabschnitt

Sechs Linden
Bauzeit: KW 33 bis KW 42

8. Bauabschnitt

Heerstraße
Bauzeit: KW 40 bis KW 46

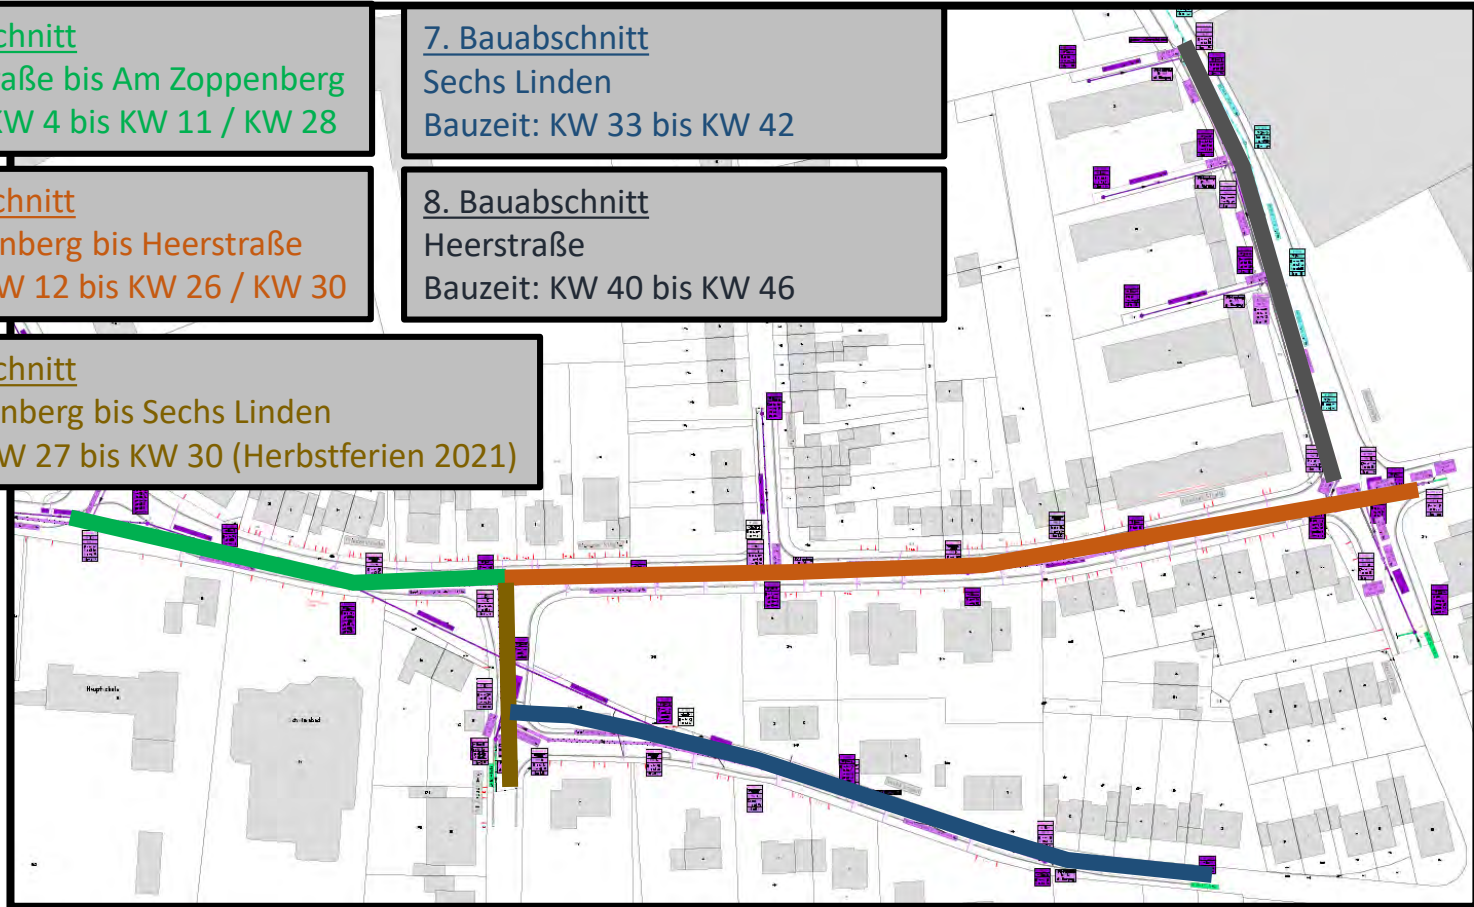

Ausbaubereich / Bauabschnitte

1. Bauabschnitt

Bauzeit: KW 32 bis KW 44 / KW 47

2. Bauabschnitt

Bauzeit: KW 45 bis KW 47

3. Bauabschnitt

Bauzeit: KW 48 bis KW 03

4. Bauabschnitt

Bauzeit : KW 4 bis KW 11 / KW 28

5. Bauabschnitt

Bauzeit: KW 12 bis KW 26 / KW 30

6. Bauabschnitt

Bauzeit: KW 27 bis KW 30 (Herbstferien 2021)

7. Bauabschnitt

Bauzeit: KW 33 bis KW 42


8. Bauabschnitt

Bauzeit: KW 40 bis KW 46

Gesamtmaßnahme:

August 2020 bis Ende November 2021

Bauzeit ca. 16 Monate

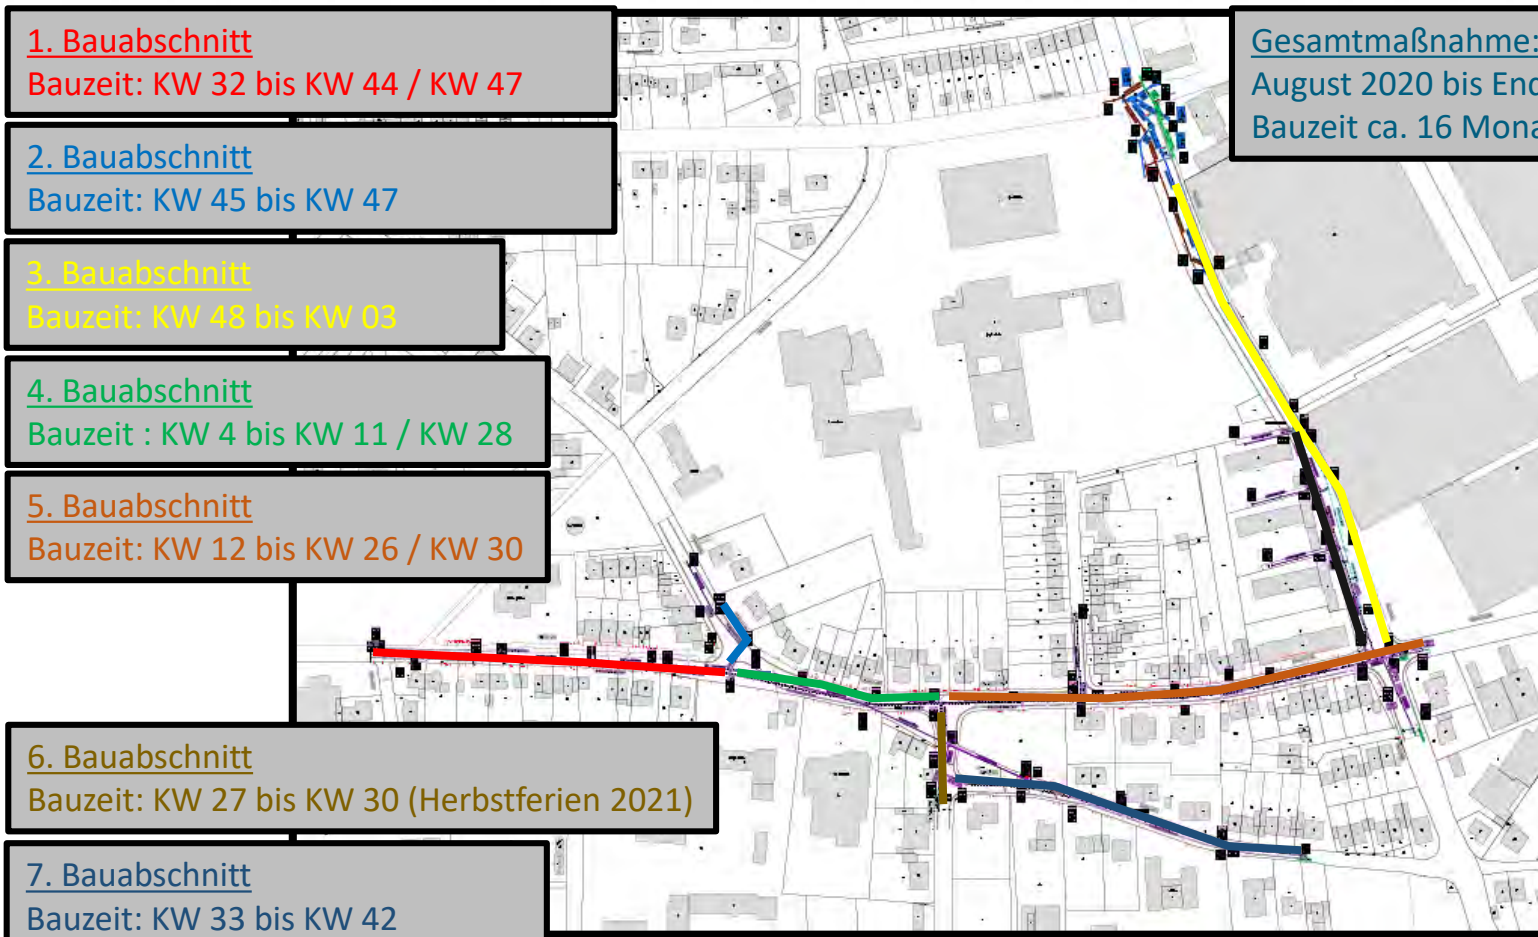


Ausbaubereich / Bauabschnitte

	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48
1. Bauabschnitt																	
Aufbrucharbeiten	■					■											
Kanalbauarbeiten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Hausanschlussleitungen											■	■	■				
Asphaltarbeiten																■	
2. Bauabschnitt																	
Aufbrucharbeiten														■			
Kanalbauarbeiten														■	■		
Hausanschlussleitungen																	
Asphaltarbeiten																■	

Ausbaubereich / Bauabschnitte

- Die Baumaßnahme wird auch innerhalb der jeweiligen Abschnitte nochmals in Arbeitsbereiche unterteilt. Die Arbeiten werden immer in einem Abschnitt von ca. 50 m Länge ausgeführt.
 - Die Zuwegungen sind grundsätzlich immer bis an die Absperrungen für Anlieger frei.
 - Während die Baumaßnahmen „vor der Haustüre“ ist die Zufahrt zum Grundstück nur eingeschränkt möglich.
 - Die Zuwegungen von Rettungskräften wird grundsätzlich immer gewährleistet.
- Ausbaubereich / Bauabschnitte
- Während der Baumaßnahmen in der Straße „Sechs Linden“ wird die Zuwegung zu der Grundschule nur von der Straße „Am Zoppenberg“ ermöglicht.

Ausbaubereich / Bauabschnitte

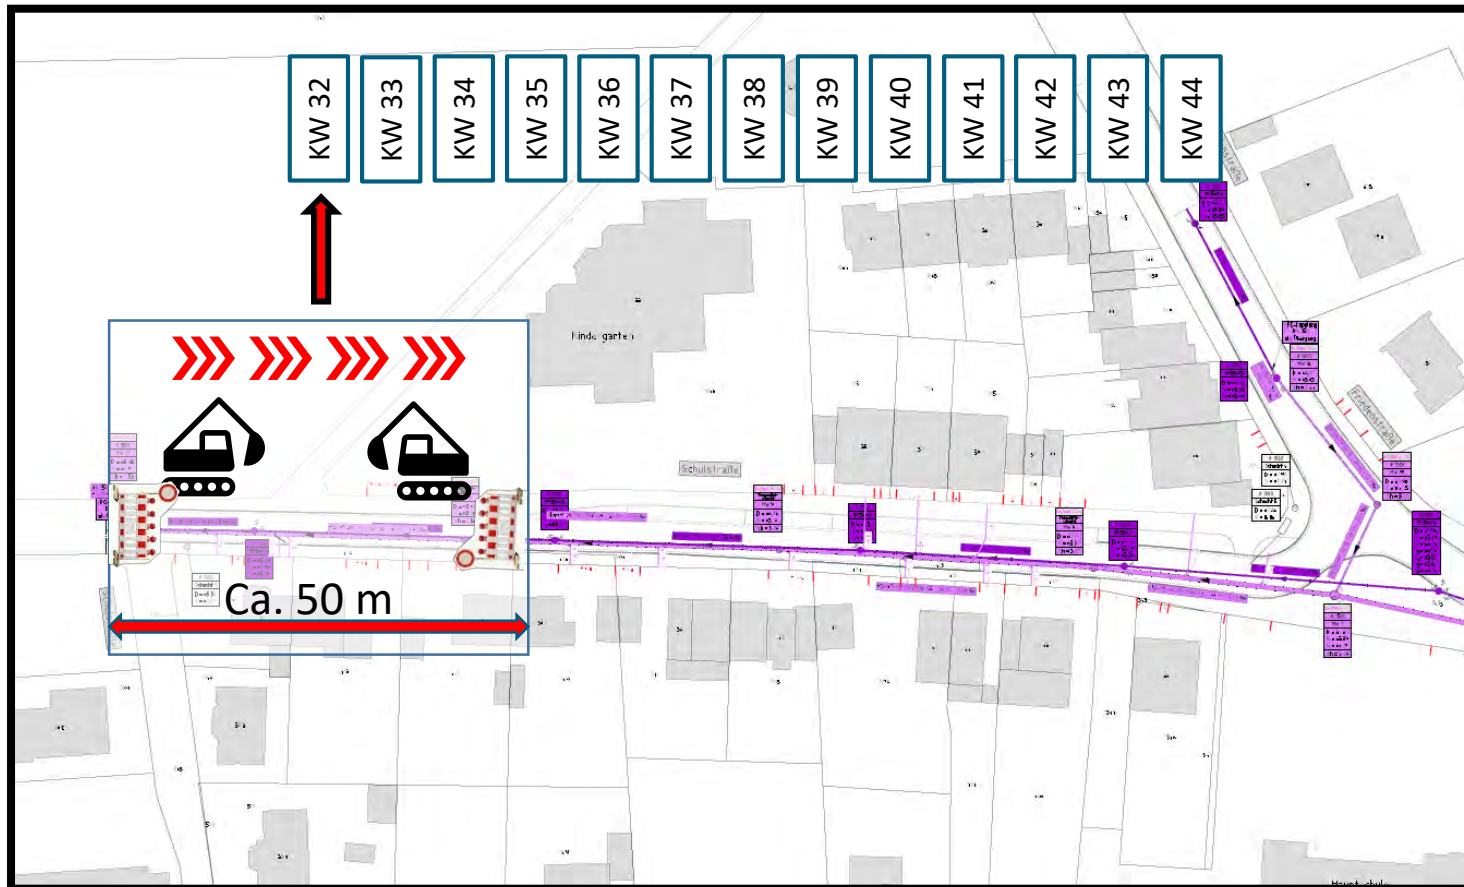

Ausbaubereich / Bauabschnitte

- Wenn es zu Problemen während der Baumaßnahme kommt, sprechen Sie die Arbeiter vor Ort direkt an oder wenden Sie sich an eine der nachfolgenden Personen:

Schwalmtalwerke AöR

Herr Milz

+49(0)2163.946321

Ingenieurbüro Goldmanns

Herr Goldmanns

+49(0)2161.4951790

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!
